

第維工43-047H-03-1他号 公共 舗装道補修(国補正分)工事にかかる交通規制のお知らせ

揖斐土木事務所発注の「第維工43-047H-3-1他号 公共 舗装道補修(国補正分)工事」において
国道417号を交通規制いたします。


ご通行される皆様に大変ご不便、ご迷惑をお掛けしますが、ご理解ご協力を
頂けますよう宜しくお願い致します。

【規制の種類 / 期間 / 時間】

全面通行止め	
期間	令和8年8月17日 ~ 令和8年9月18日 (内7日間土日祝日除く)
時間	夜間20:00 ~ 翌日6:00
制限	急カーブ及道路幅員が狭いため

片側交互通行	
期間	令和8年8月17日 ~ 令和8年9月18日
時間	終日
制限	区画線設置・出来形管理・品質管理を行なう為 終日片側交互通行を行います。

【規制位置図】

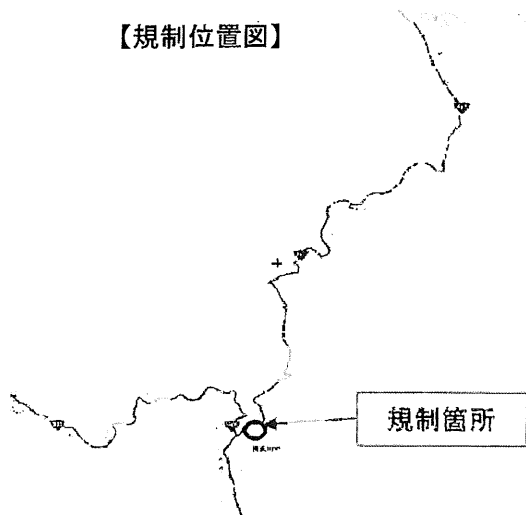

工事名	第維工43-047H-3-1他号 公共舗装道補修(国補正分)工事
発注者	揖斐土木事務所 道路課 0585-23-1111(内線337)
施工会社	株式会社久保田工務店 0585-22-2134

(1) 施工箇所位置図



交通処理計画

(1) 工事概要

工 事 名 第Ⅲ工43-047H-3-1他号 公共 舗装道補修(国補正分)工事

路 線 名 一般国道 417号

工 事 箇 所 揖斐郡揖斐川町東横山地内

工 期 令和 8年 6 月 23日～令和 8年 10月 20日

工事施工者 株式会社久保田工務店 TEL0585-22-2134
現場代理人 安藤 成年

工 事 内 容 施工延長L=142.0m W=5.70～8.0m

舗装版破碎工 A=930m²
床堀工 V=74m³
舗装補修工 A=930m²
道路付属施設工 1.0式

(2) 規制内容

規制の理由 舗装補修工事の為

規 制 種 別 ①片側交互通行

②全面通行止め

規 制 期 間 令和 8年 8月 17日～令和 8年 9月 17日
(内7日間土日曜祝日は除く)

規 制 時 間 ① 終日
② 夜間20:00 ～ 翌日6:00

(3) 施工方法(施工順序)

工事の施工方法は「岐阜県建設工事共通仕様書」を遵守します。

仮設工→舗装版破碎工→上層路盤→表層工→区画線工

(4) 交通処理方法

- ・ 舗装補修工事で舗装版破碎・上層路盤・表層舗装を全車線行うため、施工時は全面通行止め、施工終了後は片側交互通行とします。
- ・ 施工は夜間全面通行止め(20:00～6:00)で行います。
- ・ 片車線(基層工舗設まで)完了時は縦断方向に5cmの段差が生じるため次施工時まで片側交互通行とします。
- ・ 工事施工時は規制区間の前後に、誘導員・カラーコーン等を配置および設置します。
- ・ 工事終了後は規制区間の前後に、カラーコーン等を設置します。
- ・ 工事施工時は福井県側、岐阜県側に全面通行止めにともない誘導員を配置します。
※配置位置は別紙(誘導員配置位置図【広域地図】)参照
- ・ 規制区間の前後には、工事看板等50m～200m先工事中看板を設置し、14日前に 通行者に知らせます。
- ・ 作業を行わない時は、看板に【本日規制をしません】の表示をします。
- ・ 緊急車輛の通行については、万全を期します。
- ・ その他関係機関の指示に従い、交通安全に十分注意します。
- ・ 保安施設等の管理については、定期的に巡回し監視します。

(5) 交通規制図面

別紙のとおり

位置図及び通行規制詳細図
平面図
標準断面図
交通規制配置詳細図
